



การวิเคราะห์โครงการแบบ **Logical Framework**

หัวข้อ การบรรยาย



- 1 ความแตกต่างแบบประเพณีนิยม / Logical Framework
- 2 องค์ประกอบที่สำคัญ
กรอบเหตุผลสัมพันธ์
- 3 ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Log Frame
- 4 รูปแบบของการวางโครงการแบบ Log Frame
- 5 ตัวอย่าง การเขียนโครงการแบบ Log Frame

ความแตกต่าง แบบประเพณีนิยม / Logical Framework Method





ความแตกต่าง แบบประเพณีนิยม / Logical Framework Method

แบบประเพณีนิยม (Coventional Mehod)		
เริ่มคิด จาก ทรัพยากร	งบประมาณ & คน	ตอบสนอง การทำ งบประมาณ แบบแสดง รายการ

แบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Method)		
เริ่มคิดจาก	ต้องการให้ เกิดอะไร จาก โครงการ	ตอบสนอง การทำ งบประมาณ แบบมุ่งเน้น ผลงาน



ความแตกต่าง แบบประเพณีนิยม / Logical Framework Method

แบบประเพณีนิยม (Coventional Mehod)	
วิธีเขียน	พรรณา

แบบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework Method)	
วิธีเขียน	อธิบายเหตุผล แสดงความสัมพันธ์ ระหว่างโครงการ กับจุดมุ่งหมายของ แผนงาน

การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ (Logical Framework)



ความหมายของการวิเคราะห์โครงการแบบ กรอบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework)

กรอบเหตุผลสัมพันธ์ (Logical Framework หรือ Log-Frame) มาจากคำว่า Logical ซึ่งหมายถึง ตรรกะ และ Framework ซึ่งหมายถึง กรอบแนวคิด ดังนั้น Log-Frame ก็คือ การแสดงความสัมพันธ์ในเชิงเหตุผล

	NS	OVI	SOV/MOV	IA
Goals				
Objectives				
Outputs				
Activities/Inputs				
				Preconditions

องค์ประกอบที่สำคัญ กรอบเหตุผลสัมพันธ์



องค์ประกอบที่สำคัญ กรอบเหตุผลสัมพันธ์



เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ในภาพรวม
(Goal / Overall Objective)



ตัวชี้วัด (Indicators)



วัตถุประสงค์เฉพาะ
(Specific Objective / Project Purpose)



วิธีการ (Means) และค่าใช้จ่าย (Costs)



ผลผลิต (Outputs / Results)



ฐานคติ (Assumptions) หรือเงื่อนไข
ความสำเร็จ



กิจกรรม (Activities)

การเขียนโครงการแบบ Log Frame

แสดงให้เห็นความสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ

วัตถุประสงค์ของโครงการ → จุดมุ่งหมายของแผน

วัตถุประสงค์ของโครงการ → ผลงานที่ต้องการ

กระบวนการทำงาน → ทรัพยากรของโครงการ

ทรัพยากร → ผลผลิตจากโครงการและผลลัพธ์

ความสัมพันธ์ในเชิงเหตุและผลที่ประสานกันทั้งในแนวตั้งและแนวนอน



การเขียนโครงการแบบ Log Frame

จุดเด่นของโครงการแบบ Log Frame

- ❖ การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จเป็นรูปธรรม
- ❖ ทุกคนเข้าใจโครงการทั้งหมดได้โดยง่าย
- ❖ ผู้บริหารมั่นใจในการอนุมัติโครงการ
- ❖ ผู้รับมอบโครงการ มีความมั่นใจในการนำไปปฏิบัติ
- ❖ ประเมินผลสัมฤทธิ์ของโครงการได้ทันที



การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ (Logical Framework)



ความสัมพันธ์แนวดิ่ง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนงานในภาพรวม กับโครงการ โดยความสัมพันธ์อยู่ในรูปแบบ "ถ้า..แล้ว (If..then)"

□ สามารถแตกย่อยได้เป็น 4 ระดับ

1. **ระดับนโยบาย** ได้แก่ เป้าหมาย/วัตถุประสงค์ ของแผนงานในภาพรวม ในหนึ่งแผนงานอาจประกอบไปด้วยโครงการกี่โครงการก็ได้
2. **ระดับวัตถุประสงค์** ได้แก่ วัตถุประสงค์ของโครงการ ในหนึ่งโครงการอาจมีหลายวัตถุประสงค์ และแต่ละวัตถุประสงค์ก็อาจต้องการผลผลิตที่มากกว่าหนึ่งผลผลิตได้
3. **ระดับผลงาน** ได้แก่ ผลผลิตของโครงการ ในแต่ละผลผลิตของโครงการอาจต้องการกิจกรรมและทรัพยากรจำนวนมากได้
4. **ระดับปัจจัย** ได้แก่ กิจกรรมและทรัพยากรที่ใช้ในการดำเนินงาน

การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ (Logical Framework)



ความสัมพันธ์แนวดิ่ง แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างแผนงานในภาพรวม กับโครงการ โดยความสัมพันธ์อยู่ในรูปแบบ "ถ้า..แล้ว (If..then)"

❑ ในการวางแผนจะต้องคิดจากบนลงล่าง (1-2-3-4) แต่เวลาดำเนินการจะต้องทำจากล่างขึ้นบน (4-3-2-1) กล่าวคือ จะต้องเริ่มจากจัดสรรปัจจัยนำเข้า (ทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งเงิน คน เวลา เครื่องมือ) เข้าสู่กระบวนการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ได้เป็นผลผลิตขึ้นมาตามที่กำหนดวัตถุประสงค์ไว้อย่างครบถ้วนถูกต้อง จึงจะถือว่าโครงการนั้นประสบความสำเร็จ และเมื่อแต่ละโครงการในแผนงานประสบความสำเร็จแล้ว ก็จะทำให้เป้าหมายของแผนงานในภาพรวมประสบความสำเร็จด้วยเช่นกัน

❑ **Tips:** เวลาเขียน LogFrame ควรเขียนแบบ 1 วัตถุประสงค์ต่อหนึ่งตาราง ไม่ควรเขียนหลายวัตถุประสงค์ในตารางเดียวเพราะจะทำให้ยากต่อการทำความเข้าใจในความสัมพันธ์ต่าง ๆ

การวางแผนและวิเคราะห์โครงการ (Logical Framework)



ความสัมพันธ์แนวนอน แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ระหว่างรายละเอียดต่าง ๆ ของแผนงานและโครงการ

□ สามารถแตกย่อยได้เป็น 4 ระดับ

1. **คำสรุป (Narrative Summary : NS)** เป็นคำอธิบายโดยสรุปขององค์ประกอบตามความสัมพันธ์แนวดิ่ง (เป้าหมาย วัตถุประสงค์โครงการ ผลผลิต กิจกรรม และทรัพยากร) ซึ่งเป็นสิ่งที่โครงการจะเข้าไปแก้ไขปัญหาหรือไปแทรกแซง จึงมักเรียกว่า Logical Intervention
2. **ตัวชี้วัด (Objectively Verifiable Indicators : OVI)** เป็นดัชนีชี้วัดความสำเร็จในการดำเนินงาน เพื่อให้บอกได้ว่าแต่ละขั้นตอนประสบความสำเร็จหรือไม่อย่างไร
3. **แหล่งข้อมูลหรือวิธีพิสูจน์ (Sources of Verification : SOV / Means of Verification : MOV)** เป็นรายละเอียดเกี่ยวกับที่มาของข้อมูลในตัวชี้วัด เช่น จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิต่าง ๆ หรือ ต้องลงไปเก็บข้อมูลเชิงปฐมภูมิเอง
4. **เงื่อนไขความสำเร็จ (Important Assumptions : IA)** หมายถึงปัจจัยภายนอกที่ไม่อยู่ในการควบคุมของโครงการ แต่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการ

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Log Frame



ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Log Frame



โครงสร้างหรือองค์ประกอบหลักของโครงการในตารางเหตุผลสัมพันธ์ ประกอบด้วยองค์ประกอบในแนวตั้ง (Vertical Logic) และองค์ประกอบในแนวนอน (Horizontal Logic) โดยอาศัยหลักการง่าย ๆ คือ หลักการแสดงความสัมพันธ์ในเชิงที่เป็นเหตุเป็นผลแบบต่อเนื่องประสานทั้งแนวนอนและแนวตั้ง แล้วนำมาบรรจุในตารางสี่เหลี่ยม ดังแสดงในตารางที่ 1

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Log Frame



1. องค์ประกอบในแนวดิ่ง เป็นองค์ประกอบที่แบ่งระดับในการดำเนินงานออกเป็น ระดับจุดมุ่งหมายของแผนงาน (Goal) ระดับวัตถุประสงค์ของโครงการ (Purpose) ระดับผลงานหรือผลผลิต (Output) ระดับกิจกรรมและทรัพยากร (Activities & Input)



ตารางที่ 1 : แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Log Frame

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Log Frame




การกำหนดองค์ประกอบในแนวตั้ง โดยทั่วไปอาจจะเห็นได้ใน 2 แบบ คือแบบที่ไม่ได้มีการกำหนดกิจกรรม หรือบางโครงการต้องการรายละเอียด ในส่วนนี้จะกำหนดกิจกรรมไว้ เพื่อให้การพิจารณารอบคอบมากขึ้น การบรรจุรายละเอียดจะเริ่มตั้งแต่ส่วนบนสุดที่แสดงถึงภาพในระดับกว้าง คือ จุดมุ่งหมาย (Goal) ที่ถูกกำหนดเป็นข้อๆ แต่ละข้อก็จะนำมาแตกรายละเอียดเป็นวัตถุประสงค์ (Purpose) ในแต่ละข้อของวัตถุประสงค์ ก็ถูกกำหนดออกมาในสิ่งที่ต้องการ (Output) ในแต่ละ Output จะต้องทำกิจกรรม (Activities) อะไรบ้าง และในแต่ละกิจกรรมจำเป็นจะต้องใช้ปัจจัยการดำเนินงาน (Input) อะไรบ้าง และทั้งหมดของ แต่ละหัวข้อก็จะถูกรวบรวมอยู่ในลักษณะที่ตรวจสอบได้ง่าย

ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Log Frame



2. องค์ประกอบในแนวนอน เป็นองค์ประกอบที่แสดงสาระสำคัญต่างๆ เช่น สาระสำคัญโดยสรุป ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ หลักฐานหรือแหล่งพิสูจน์ และเงื่อนไขแห่งความสำเร็จ ดังตารางที่ 3

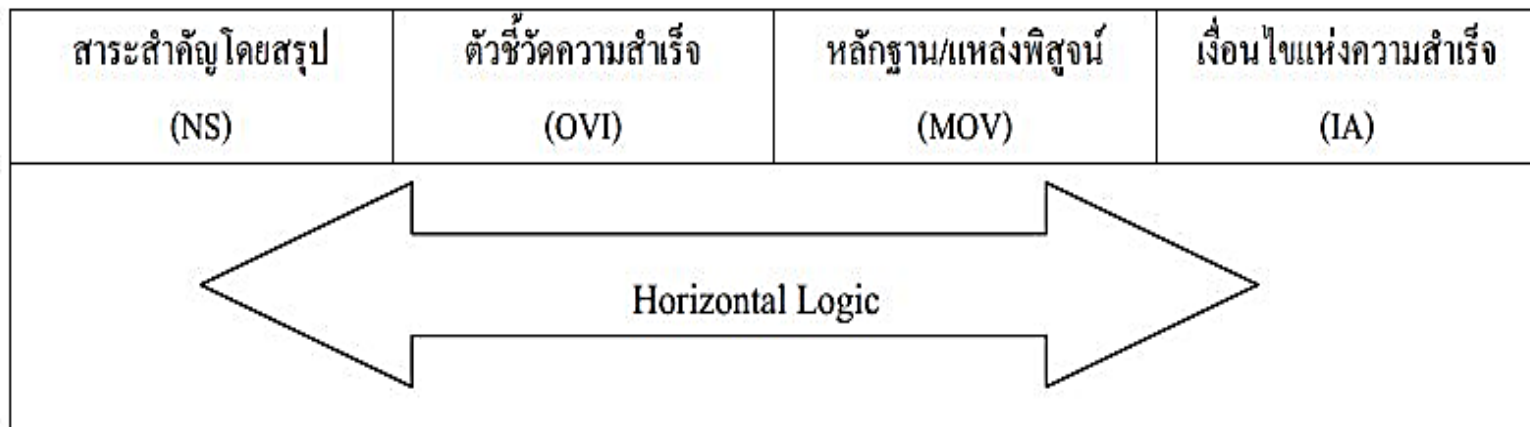

ตารางที่ 3 : องค์ประกอบตามแนวนอนของ Log Frame

รูปแบบของการวางโครงการ แบบ Log Frame



รูปแบบของการวางโครงการแบบ Log

Frame

สาระสำคัญ / คำสรุป

(NS = Narrative Summary)

คือการชี้ให้เห็นว่าโครงการจะดำเนินไป
ได้ต้องมีรายละเอียดสรุปเป็นข้อ ๆ และใน
สาระที่สรุปควรตรวจนับได้ในเชิงปริมาณ
หัวข้อต่าง ๆ จะปรากฏในองค์ประกอบ
แนวตั้งคือ จุดมุ่งหมายของแผน
วัตถุประสงค์ของโครงการ ผลงานหรือ
ผลผลิตของโครงการ กิจกรรมของ
โครงการ และปัจจัยหรือทรัพยากรที่
จำเป็นต้องใช้

ตัวชี้วัดความสำเร็จ


(OVI หรือ KPI = Objectively Verifiable Indicators)

หรือเรียกอีกอย่างว่า Key Performance In
dicators) คือการชี้ให้เห็นว่า รายการในแต่ละ
แถวในคอลัมน์ ที่ 1 (NS) มีตัวชี้วัด
ความสำเร็จกำกับอยู่ด้วย เช่น ตัวชี้วัด
ความสำเร็จของจุดมุ่งหมายของแผน
ตัวชี้วัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์
โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลงาน
และตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมและ
ทรัพยากรในโครงการ



ตารางการบันทึกข้อมูล Log Frame



 แนวตั้ง (Vertical)	คำสรุป (NS.)	ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (OVI)	หลักฐาน / แหล่งพิสูจน์ (MOV)	เงื่อนไขความสำเร็จ (IA)
	Goal จุดมุ่งหมาย			
	Purpose / Objective วัตถุประสงค์			
	Output ผลงาน / ผลผลิต			
	Activities & Inputs กิจกรรม / ปัจจัยนำเข้า หรือทรัพยากร			
 แนวนอน (Horizontal)				

ตารางที่ 1 : แสดงความสัมพันธ์เชิงเหตุผลของ Log Frame

รูปแบบของการวางโครงการแบบ Log

Frame

แหล่งข้อมูลหรือวิธีพิสูจน์ความสำเร็จ
(MOV = Means of Verification)

คือการชี้ให้เห็นว่ารายการในแต่ละแถวในคอลัมน์ที่ 3 มีวิธีการตรวจสอบติดตามและประเมินผลอยู่ด้วย โดยแสดงให้เห็นว่าตัวบ่งชี้ความสำเร็จดังกล่าวจะมีวิธีการตรวจวัดได้อย่างไร หรือระบุแหล่งที่จะให้ได้มา ซึ่งข้อมูลดังกล่าว

เงื่อนไขสำคัญของความสำเร็จ
(IA = Important Assumption)

หรือเรียกอีกอย่างว่า Key Performance Indicators) คือการชี้ให้เห็นว่า รายการในแต่ละแถวในคอลัมน์ ที่ 1 (NS) มีตัวชี้วัดความสำเร็จกำกับอยู่ด้วย เช่น ตัวชี้วัดความสำเร็จของจุดมุ่งหมายของแผน ตัวชี้วัดความสำเร็จของวัตถุประสงค์โครงการ ตัวชี้วัดความสำเร็จของผลงาน และตัวชี้วัดความสำเร็จของกิจกรรมและทรัพยากรในโครงการ



สรุปสาระสำคัญในแต่ละช่องของ Log Frame

สาระสำคัญโดยสรุป (NS)	ตัวชี้วัดความสำเร็จ (OVI)	แหล่งข้อมูลและวิธีพิสูจน์ (MOV)	เงื่อนไขแห่งความสำเร็จ (IA)
จุดมุ่งหมายของแผน (Program Goal) กำหนดเป็นข้อ ๆ	ตัวชี้วัดที่จะบ่งบอกถึงความสำเร็จตามจุดหมายของแผน หรือแผนงาน	แหล่งข้อมูลที่จะวัดได้ถึงการบรรลุความสำเร็จของแผนหรือแผนงาน	เงื่อนไขที่จะช่วยให้จุดมุ่งหมายของแผนบรรลุผลสำเร็จตามที่ตั้งไว้
วัตถุประสงค์ (Purpose) ของโครงการ นำวัตถุประสงค์มาแตกเป็นข้อๆ	ตัวชี้วัดที่จะวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ที่วางไว้เมื่อโครงการสิ้นสุด	แหล่งข้อมูลที่จะวัดความสำเร็จตามวัตถุประสงค์	เงื่อนไขที่จะช่วยให้วัตถุประสงค์ของโครงการบรรลุผลสำเร็จ
ผลงาน (Outputs) หรือ ผลผลิตของโครงการ	ตัวชี้วัดความสำเร็จของงานหรือผลผลิตเพื่อความสำเร็จตามวัตถุประสงค์	แหล่งข้อมูลที่จะตรวจวัดผลผลิตหรือผลงาน	ข้อสมมติฐานสำคัญที่ผลงานจะบรรลุตาม Purpose ที่วางไว้
กิจกรรม(Activities) ที่จะดำเนินงานตามโครงการ	- รายละเอียดปัจจัยแต่ละตัวที่ต้องใช้ทำกิจกรรม - ระบุกิจกรรมที่จะต้องทำว่ามีอะไรบ้าง - ระบุช่วงเวลาที่ทำกิจกรรม	- แหล่งแสดงรายการที่ยืนยันว่าได้มีการจัดกิจกรรม ตามที่กำหนดจริง	- เงื่อนไขจากปัจจัยภายนอกที่จะทำให้เกิดกิจกรรมของโครงการ
ปัจจัยนำเข้า (Input) หรือ ทรัพยากร (Resources) ในโครงการ	- ระบุรายละเอียดของทรัพยากรที่ใช้จริง	- แหล่งข้อมูลที่จะแสดงรายการการใช้ทรัพยากรในแต่ละกิจกรรมจริง	- ข้อกำหนดเกี่ยวกับการได้มาซึ่งทรัพยากรในการดำเนินโครงการ

การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในแนวตั้งของ Log Frame

เพื่อให้แน่ใจว่าการระบุสาระสำคัญในแต่ละส่วน ทั้งแนวตั้ง และแนวนอนของ Log Frame ดำเนินการอย่างสมเหตุสมผล สามารถตรวจสอบได้ 2 รูปแบบคือ

1. วิธีใช้เหตุผลทางตรรกวิทยาตรวจสอบในแนวตั้ง ซึ่งอธิบายได้ 2 ลักษณะดังนี้
 - 1.1 การตรวจสอบจากบนลงล่าง โดยตั้งคำถามว่า “**ทำอะไร**” (How) ไหลลงไปเป็นทอด ๆ จากแถวบนสุด ให้ต่อเนื่องกัน ดังนี้
 - ☐ ทำอย่างไรจึงจะบรรลุผลตามจุดมุ่งหมายของแผน ? คำตอบที่ได้จะเป็นสิ่งกำหนด “**วัตถุประสงค์ของโครงการ**”



การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในแนวตั้งของ Log Frame

1. วิธีใช้เหตุผลทางตรรกวิทยาตรวจสอบในแนวตั้งด้วยการตั้งคำถาม ดังนี้

- ✓ ทำอย่างไรจึงจะบรรลุผลตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ? คำตอบที่ได้คือ “สิ่งที่กำหนดผลงาน / ผลผลิตของโครงการ”
- ✓ ทำอย่างไรที่จะได้ผลผลิตหรือผลงานของโครงการ ? จะเป็นสิ่งที่กำหนดการใช้ทรัพยากร/ กิจกรรมในโครงการนั้น
- ✓ ทำอย่างไรจึงจะได้ทรัพยากรที่จำเป็นในการดำเนินโครงการ ?



การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในแนวตั้งของ Log Frame

1. วิธีใช้เหตุผลทางตรรกวิทยาตรวจสอบในแนวตั้งด้วยการตั้งคำถาม ดังนี้

1.2 การตรวจสอบจากล่างขึ้นบน โดยตั้งคำถามว่า “ทำไม” (Why) ต่อเนื่องกัน โดยไล่จากแถว
ล่างสุดขึ้นไปข้างบนเป็นทอดๆ ดังนี้

- ทำไมต้องใช้ทรัพยากรในการทำกิจกรรมนั้น ? คำตอบที่ได้จะเป็นสิ่งที่กำหนด “ผลงาน / ผลผลิต
ของโครงการ”
- ทำไมต้องกำหนดผลผลิต/ผลงาน ของโครงการเช่นนั้น ? คำตอบที่ได้จะเป็นสิ่งที่กำหนด “
วัตถุประสงค์ของโครงการ”
- ทำไมต้องกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการอย่างนั้น ? คำตอบที่ได้จะเป็นสิ่งที่กำหนด “
จุดมุ่งหมายของแผน / แผนงาน”



การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในแนวตั้งของ Log Frame

2. วิธีใช้เหตุผลทางตรรกวิทยาตรวจสอบในแนวนอนด้วยการตั้งคำถาม ดังนี้

- 2.1 ใช้คำถามว่า "ทำไม" (Why) โดยไล่ไปทางด้านซ้ายเป็นทอด ๆ จากคอลัมน์ขวาสุด เช่น
- ทำไมจึงต้องมีเงื่อนไขความสำเร็จของการได้มาซึ่งทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 - ทำไมต้องมีแหล่งข้อมูลและการประเมินความสำเร็จของการได้มาซึ่งทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการ
 - ทำไมต้องมีตัวชี้วัดความสำเร็จของแหล่งทรัพยากรในโครงการ
 - ทำไมต้องมีการระบุกิจกรรมและทรัพยากรที่จำเป็นสำหรับโครงการ



การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในแนวตั้งของ Log Frame

2. วิธีใช้เหตุผลทางตรรกวิทยาตรวจสอบในแนวนอนด้วยการตั้งคำถาม ดังนี้

2.2 ใช้คำถามว่า " ทำอย่างไร " (How) ไล่ไปด้านขวาเป็นทอดๆ จากคอลัมน์ด้านซ้ายสุด
เช่น

- ทำอย่างไรจึงจะบรรลุวัตถุประสงค์ของแผนงาน
- ทำอย่างไรจึงจะเชื่อได้ว่าตัวชี้วัดความสำเร็จของแผนงานนั้นเชื่อถือได้
- ทำอย่างไรจึงจะเชื่อได้ว่าแหล่งข้อมูล และการประเมินความสำเร็จของแผนงานนั้นเชื่อถือได้
- ทำอย่างไรจึงจะเชื่อได้ว่าเงื่อนไขสำคัญแห่งความสำเร็จนั้นเชื่อถือได้



การตรวจสอบความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลในแนวตั้งของ Log Frame

2. วิธีใช้เหตุผลทางตรรกวิทยาตรวจสอบในแนวนอน ดังนี้

จากการที่อธิบายความสัมพันธ์เชิงเหตุและผลซึ่งกันและกันทั้งในแนวตั้ง (Vertical Logic) จากบนลงล่าง และจากล่างขึ้นบน และในแนวนอน (Horizontal Logic) ทั้งจากซ้ายไปขวา และจากขวาไปซ้าย จึงทำให้การเขียนโครงการแบบ Log Frame เป็นวิธีที่มีเหตุผล น่าเชื่อถือสามารถประเมินผลโครงการได้ง่าย ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในแนวตั้ง (Vertical Logic) ดังกล่าวข้างต้นสามารถสรุปได้ ดังแผนภูมิ



ความสัมพันธ์เชิงเหตุผลในแนวตั้งของโครงการ



จุดมุ่งหมายของแผนงาน



วัตถุประสงค์ของโครงการ



ผลงาน/ผลผลิตของโครงการ



กิจกรรมและทรัพยากรที่ใช้ใน
โครงการ

ตัวอย่าง การเขียนโครงการ แบบ Log Frame



ตัวอย่าง การเขียนโครงการแบบ Log Frame



ชื่อโครงการ : โครงการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	สรุปสาระสำคัญ (NS)	ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (OVI)	แหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์ (MOV)	เงื่อนไขความสำเร็จ (IA)
Goal	ผลิตบัณฑิตตอบสนองต่อความต้องการของท้องถิ่น	จำนวนบัณฑิตที่ทำงานในท้องถิ่น ร้อยละ 60	การสำรวจจากหน่วยงาน/สถานประกอบการ	หน่วยงาน/สถานประกอบการหรือชุมชนมีตำแหน่งงานรองรับ
Purpose	- ผลิตบัณฑิตให้มีความรู้ด้านบริหารจัดการ - เพื่อให้บัณฑิต รปศ. นำความรู้ไปประกอบอาชีพได้	- จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาคิดเป็นร้อยละ 90 - จำนวนบัณฑิตที่มีงานทำภายใน 1 ปีคิดเป็นร้อยละ 60 - ระดับความพึงพอใจของนายจ้างในเกณฑ์ระดับมาก	การสำรวจข้อมูลจากหน่วยงาน/สถานประกอบการโดยใช้แบบสอบถาม	- นโยบายการจัดการศึกษาของสถาบันมีความต่อเนื่อง - ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันได้รับการรับรองมาตรฐาน

ตัวอย่าง การเขียนโครงการแบบ Log Frame

ชื่อโครงการ : โครงการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	สรุปสาระสำคัญ (NS)	ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (OVI)	แหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์ (MOV)	เงื่อนไขความสำเร็จ (IA)
Output	บัณฑิต ปรศ. ที่มีคุณภาพ	- จำนวนบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาภายใน 4 ปี GPA. ไม่น้อยกว่า 2.5 - บัณฑิตมีงานทำภายใน 1 ปี ร้อยละ 60	- การประมวลผลการเรียนของฝ่ายทะเบียนวัดผล - ข้อมูลจากบัณฑิตและสถานประกอบการ	- ระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ ผ่านการรับรองมาตรฐาน - การเติบโตของเศรษฐกิจอยู่ในภาวะปกติ

ตัวอย่าง การเขียนโครงการแบบ Log Frame

ชื่อโครงการ : โครงการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	สรุปสาระสำคัญ (NS)	ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (OVI)	แหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์ (MOV)	เงื่อนไขความสำเร็จ (IA)
Activities	- พัฒนาหลักสูตร - จัดกิจกรรมการสอน - พัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ - พัฒนาเอกสารตำรา - พัฒนาอาจารย์ - บริการทางวิชาการ/วิจัย - ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ	<u>สิ้นปี 256x</u> - มีหลักสูตรปรับปรุงใหม่ - มีกิจกรรมภาคการเรียนละ 2 ครั้ง - มีสื่อฯ บนอินเทอร์เน็ต - มีเอกสารตำราไม่น้อยกว่า 4 รายวิชา - มีผลงานทางวิชาการเพิ่มขึ้น - มีผลงานวิจัยปีละ 1 เรื่อง - นักศึกษาฝึกประสบการณ์ฯ ผ่านร้อยละ 100	- ตรวจสอบผลงานจาก คณะมนุษยศาสตร์ฯ - สอบถามนักศึกษา - ตรวจสอบจำนวนสื่อฯ - ตรวจสอบเอกสารตำรา - สำรวจข้อมูลจากคณะ - สำรวจข้อมูลจากคณะ - สำรวจข้อมูลจากฝ่ายทะเบียน - วัดผล	- คณะมนุษยฯ จะต้องสนับสนุนการจัดการศึกษาของโปรแกรมวิชาอย่างจริงจัง - มีความร่วมมือจากหน่วยฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

ตัวอย่าง การเขียนโครงการแบบ Log Frame

ชื่อโครงการ : โครงการจัดการศึกษาโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์

	สรุปสาระสำคัญ (NS)	ตัวบ่งชี้ความสำเร็จ (OVI)	แหล่งข้อมูล/วิธีพิสูจน์ (MOV)	เงื่อนไขความสำเร็จ (IA)
Input	- บุคลากร (.....ตำแหน่ง) - งบดำเนินการ - งบลงทุน	<u>ปี 256x</u> - สาขา รปศ. 3 ตำแหน่ง - สาขารัฐศาสตร์ 1 ตำแหน่ง - สาขานิติศาสตร์ 2 ตำแหน่ง - วัสดุ / ตอบแทน / วัสดุ = 200,000 บาท - ครุภัณฑ์ = 100,000 บาท	- ข้อมูลจากฝ่ายการเจ้าหน้าที่ - ข้อมูลจากสำนักวางแผน	- ได้รับการสนับสนุน อัตราค่าจ้างจาก หน่วยงานต้นสังกัด - สถาบันให้การ สนับสนุนงบประมาณ อย่างจริงจัง



Thank you

This text can be replaced with your own text

ติดต่อ & Interfinn



ศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมด้วยตนเอง

<https://eiamsri.wordpress.com/>

<http://interfinn.com>



ติดต่อ คุณเอกกมล (ตั๋ย)



081 588 1532



Line ID : INTERFINN



INTERFINN@GMAIL.COM
